

Coordenadas UTM
30 S 631595 4204475
Datum WGS 84
Cota 506 m


Sima de la Higuera

pozos de acceso
ficha instalación

Pliego - Murcia

Datos Técnicos

Topo: © CENM-naturaleza
Fecha: 20-12-2010, v-05-12
Método; medición digital
Desnivel: - 72 m
Fraccionamientos: 13
Cuerda aconsejada: 130m (60+70)

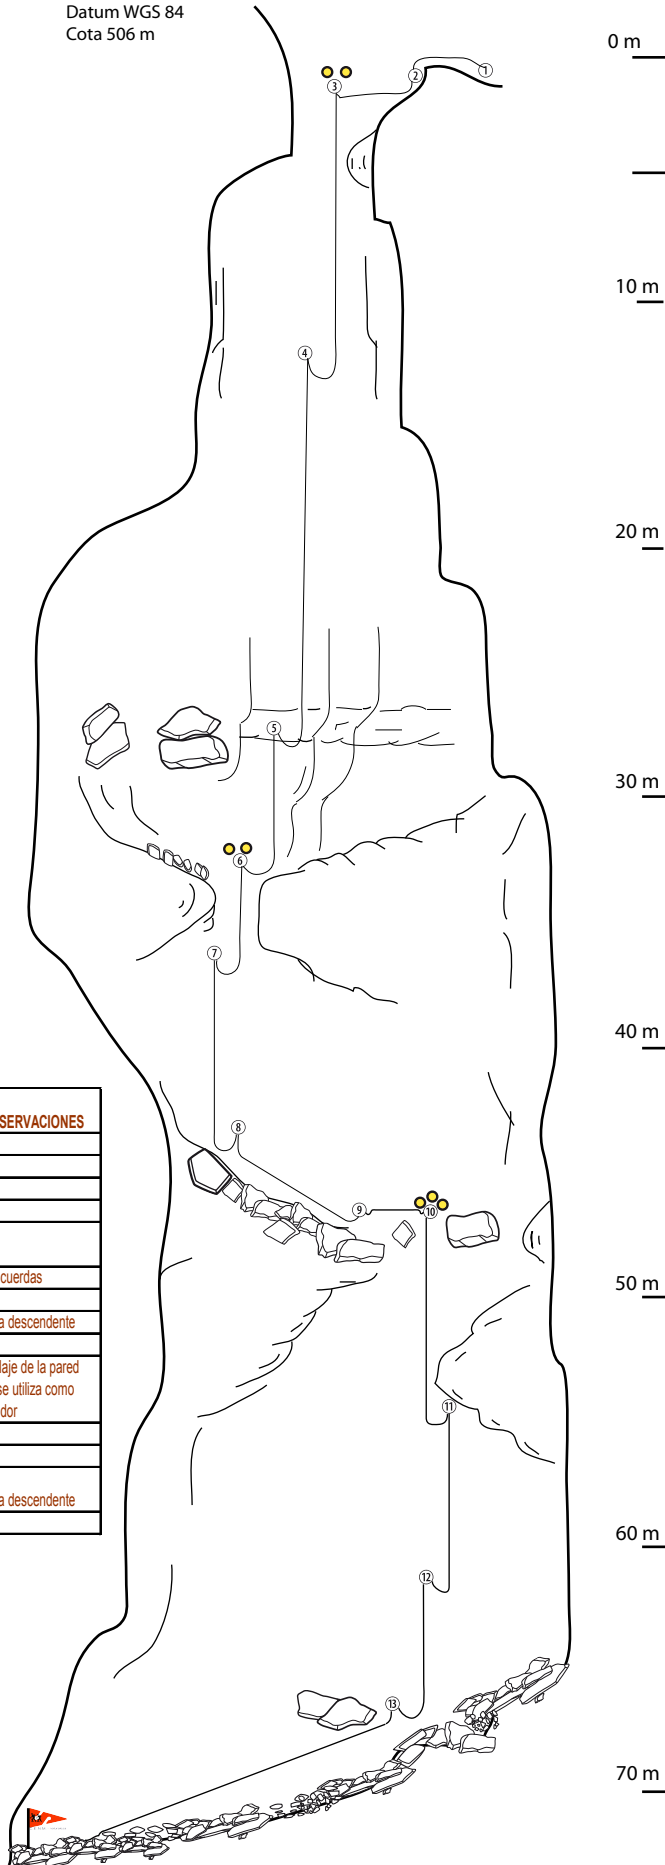

Num. Punto en plano	POZOS	COTA	CUERDAS metros	ANCLAJES	OBSERVACIONES
1	Pm3	0	7	F1 1p (fuera reja)	
2	Pm3	-1	5	F2 1p (pared bajo reja)	
3	P11	-1	15	C1 2p-placa (pared sur)	
4	P15	-12	18	F3 1p-placa (pared sur)	
5	P5	-27	8	F4 1p-placa (borde pared norte)	
6	P4	-32	8	C2 2p-placa (pared sur)	Unión cuerdas
7	P7	-36	10	F5 1p-placa (pared norte)	
8	R6	-43	8	F6 1p-placa (pared norte)	Rampa descendente
9	Pm3	-46	5	F7 1p-placa (pared norte)	
10	P8	-46	16	C3 3p-placa (2pared sur 1 pared norte)	El anclaje de la pared norte se utiliza como desviador
11	P7	-54	10	F8 1p-placa (pared sur)	
12	P5	-62	8	F9 1p-placa (pared norte)	
13	R11	-67	12	F10 1p-placa (fondo rampa pared norte)	Rampa descendente
	TOTAL	Cuerda m.	130		

Simbología	
P	Pozo Vertical
F	Fijaciones o fraccionamiento
C	Cabecera
R	Rampa
Pm	Pasamanos

IMPORTANTE! ACERCA DE LA INSTALACION DE LOS POZOS: la información que se muestra en la pagina y dibujo de los pozos es la que hay en la sima a fecha de 20-12-2010, es solo a titulo informativo y en ningún momento a partir de esta fecha no se puede garantizar su estado tal y como aquí se muestra ni que estos elementos de instalación estén en la situación del dibujo, dado que se trata de una cavidad que se encuentra en el medio natural y no se tiene acceso al control del estado de las instalación continuamente, por lo que cada grupo que descienda asume la seguridad de la instalación y de las personas que desciendan.

Por ello indicamos que los grupos que desciendan deben llevar equipos de instalación y anclajes por si consideran o necesitan instalar algún elemento para su seguridad (Informando posteriormente del mismo)

SE RECOMIENDA REVISAR LOS ANCLAJES, LLEVAR LLAVE.

El hecho de descender a la sima por su cuenta acepta asumir su responsabilidad en la seguridad de la instalación y de las personas que descienden.

La F.E.R.M. dispone de un equipo de Técnicos Especialistas que pueden realizar la instalación de pozos y acompañar si a si lo requiere algún visitante, sujeto a disponibilidad y a petición previa con la F.E.R.M.
